





**Bassin Aube Aval**  
**Masse d'eau : Aube**

**Référent : Xavier**  
**SCHMIDT**

**Communes : de Arcis sur Aube à**  
**Marcilly-sur-Seine**

**Description de l'opération :** Un état des lieux des embâcles présents a été réalisé sur la rivière Aube lors des descentes en bateau du 11 au 13 septembre 2018. Une cartographie des embâcles a été réalisée sur l'ensemble du tronçon allant d'Arcis-sur-Aube à Baudement. Une nouvelle descente de l'Aube a été réalisée le 16 avril 2019 afin de suivre l'évolution des embâcles et organiser une intervention de l'équipe en régie du SDDEA.

Après validation des préconisations d'intervention par le conseil de bassin de l'Aube Aval, les embâcles ont été traités du 23 au 25 Avril 2019 par les agents du SDDEA (intervention en bateau avec stockage du bois coupé en haut de berge pour éviter tout risque de reprise par la prochaine crue). Une nouvelle intervention a eu lieu du 17 au 19 septembre 2019 par les agents du SDDEA.

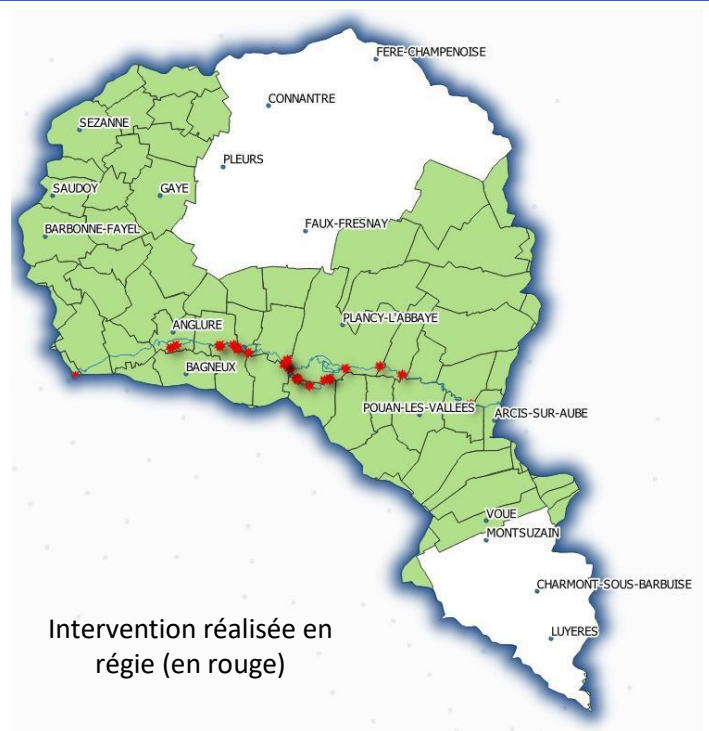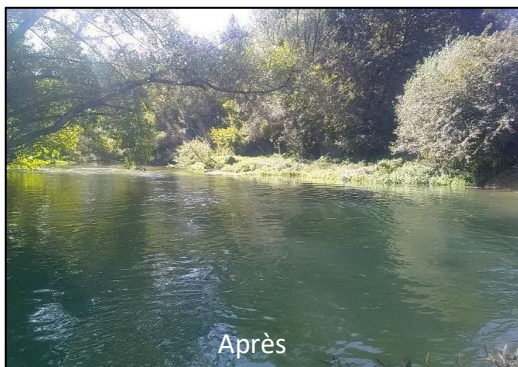

**Avancement :**

Au total, il y'a eu plus de 30 interventions réalisées sur le Bassin de l'Aube Aval. Deux secteurs n'ont pu être prospectés en raison des niveaux d'eau trop faibles, une sur la commune d'Anglure et l'autre sur la commune de Plancy-l'Abbaye. Il sera nécessaire de prévoir une nouvelle intervention sur ces deux tronçons en janvier/février 2020. En parallèle, un marché public sera lancé fin 2019 pour la réalisation d'opérations d'entretien ou de restauration sur le Bassin.
